



MUŞ VALİLİĞİ

İLİMİZDE KAMU KURUM VE KURULUŞLARIMIZCA GERÇEKLEŞEN VE GERÇEKLEŞECEK OLAN YATIRIMLAR

MUŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Sıra No	Proje Adı	Başlama ve Bitiş Tarihi	Proje Tutarı (TL)	Yapılan Top. Harcma (TL)	Dön. Fiz. Gerç. (%)	Açıklama
1	Karni Deresi Rekreasyon Alanı Projesi	2015-2017	7.648.760	4.957.760	72	Devam ediyor.
2	Karni Deresi Sosyal Tesis Yapım İşİ	2017-2017	3.599.000	3.186.000	90	Devam ediyor.
3	Bilgi Evi-Semt Havuzu-Güreş Salonu Yapımı ve Çevre Düzenlemesi	2016-2017	1.180.000	1.180.000	100	Tamamlandı.
4	Yeni Şehirlerarası Otobüs Terminali	2016-2018	10.443.000	1.357.000	13	Devam ediyor.
5	Diğer Küçük Projeler (10 Proje)	2016-2018	4.110.000	-	-	Muhtelif
TOPLAM			26.980.760	10.680.760	40	



MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ

Sıra No	Proje Adı	Başlama ve Bitiş Tarihi	Proje Tutarı (TL)	Yapılan Top. Harcama (TL)	Dön. Fiz. Gerç. (%)	Açıklama
1	Kampüs Altyapısı (DAP)	2009-2019	42.893.000	29.414.000	69	Devam ediyor
2	Derslik ve Merkezi Birimler (DAP)	2009-2018	105.235.000	76.527.000	73	Devam ediyor
3	Lojman ve Sosyal Tesisler (DAP)	2009-2018	22.414.000	17.432.000	78	Devam ediyor
4	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	2010-2018	20.229.000	12.895.000	64	Devam ediyor
5	Çeşitli Ünitelerin Etüd ve Projesi (DAP)	2017-2017	3.732.000	2.837.000	77	Devam ediyor.
6	Merkezi Araştırma Laboratuvarı	2010-2017	6.254.000	2.449.000	40	Devam ediyor.
7	Muhtelif İşler (DAP)	2017-2017	24.556.000	17.604.000	72	Devam ediyor.
8	Yayın Alımı (DAP)	2017-2017	850.000	233.000	28	Devam ediyor.
	TOPLAM		226.163.000	159.391.000	71	



MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL TESİSLER (Misafirhane)



LOJMANLAR



FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
(Tasarım Projesi)



FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2. ETAP



FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 1. ETAP





DSİ 17. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Sıra No	Proje Adı	Başlama ve Bitiş Tarihi	Proje Tutarı (TL)	Yapılan Top. Harcama (TL)	Dön. Fiz. Gerç. (%)	Açıklama
1	Alpaslan I Barajı ve HES	1995-2017	325.166.502	309.879.938	95	Devam ediyor
2	Alpaslan I Barajı ve HES Santral Binası Çevresi İyileştirme Proje Yapımı	2017-2017	60.000	-	-	İhale aşaması
3	Muş-Karasu Yatak Islahı 3.Kısım (km 20+405-63+515 km)	2014-2017	67.795.830	43.862.683	68	Devam ediyor
4	Muş-Murat Çayı Islahı Planlama Yapımı	2016-2017	950.000	-	-	İhale aşaması
5	17.Bölge Müdürlüğü Muş İli 1.Grup Küçük Gölet Teknik Raporu ve Proje Yapımı	2017-2017	550.000	-	-	Proje aşaması
6	Muş-Bulanık ve Güllüova Sulaması Teknik Rapor Hazırlanması	2017-2017	750.000	-	-	Proje aşaması
7	Alparslan II Barajı Muş Ovası Sulaması Planlama Revizyonu ve Proje Yapımı	2012-2017	5.697.409	5.019.960	95	Devam ediyor
8	Alpaslan 1 Barajı Enjeksiyon İkmali	2015-2017	2.338.298	1.784.412	20	Devam ediyor
9	Muş İli Taşkın Koruma Tesisleri Proje Yapımı 2. Kısım	2016-2017	155.710	157.346	100	Tamamlandı
10	Muş İli Taşkın Koruma Tesisleri Proje Yapımı 3. Kısım	2016-2017	105.020	36.757	100	Tamamlandı
11	Muş ve Bitlis İlleri Taşkın Kor. Tes. Proje Yapımı	2017-2017	500.000	-	-	İhale aşaması
12	Muş Ovası Sulaması I. Kısım	2017-2021	200.000.000	-	-	İhale aşaması
13	Muş Ovası Sulaması Malzeme Alımı	2017-2021	120.000.000	-	-	İhale aşaması
14	NATO Boru Hattı Deplasesi Yapımı	2017-2017	600.000	-	-	İhale aşaması
15	Muş-Hınıs-Ulusu Sulaması 3.Kısım	2017-2018	6.000.000	-	-	İhale aşaması
16	Muş-Merkez Çarçayı	2015-2017	4.732.287	4.732.287	100	Tamamlandı
17	Muş-Korkut İlçesi Karakale ve Suluk Dereleri	2015-2017	1.252.004	376.367	45	Devam ediyor
18	Muş-Korkut Altınova Beldesi Mamşek Deresi	2017-2018	356.000	-	90	Devam ediyor
19	Muş 1071 Malazgirt Karahasan Göleti ve Sulaması	2017-2018	76.300.000	-	-	Proje aşaması
20	Muş-Bulanık Mollakent Göleti ve Sulaması	2017-2018	14.500.000	-	-	Proje aşaması

DSİ 17. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Sıra No	Proje Adı	Başlama ve Bitiş Tarihi	Proje Tutarı (TL)	Yapılan Top. Harcama (TL)	Dön. Fiz. Gerç. (%)	Açıklama
21	Muş İli 2.Grup Köyler (Muş Merkez Bostankent Köyü Köyiçi Deresi, Muş Bulanık İlçesi Meşe İçi Köyü Köyiçi Deresi Tersip Bentleri ve Islah Sekileri Yapımı, Muş Bulanık Olurdere (Menfez Yapımı)	2017-2017	1.100.000	-	-	İhale aşaması
22	Muş İli 1.Grup Köyler (Muş Merkez Büvetli Köyü Avzut Deresi, Muş Merkez Çengilli Köyü Köyiçi Deresi, Muş İli Merkez Karaağaç Köyü Mıstı Deresi, Muş-Merkez Alparslan Üniversitesi T1, T2, T3, T4,T5 ve T6 Dereleri, Muş ili Bulanık İlçesi Gültepe Köyü Ekenek Mezrası Köyiçi Deresi Tersip Bentleri ve Islah Sekileri Yapımı)	2017-2017	4.450.000	-	-	İhale aşaması
23	Muş Bulanık İlçe Merkezi Körsu Deresi Üst Havza Tedbirleri İkmali	2017-2018	5.000.000	-	-	İhale aşaması
24	Muş-Varto Alistan Mikro Havzası Sulama Alt Yapısı ve Muş-Hasköy Değirmendere Havzası Sulama Alt Yapısı	2017-2018	6.076.358	-	10	Devam ediyor
25	Muş Arak Çayı Menfez Yapımı İşi	2017-2017	264.114	-	-	Devam ediyor
26	2016 Yılı Muş Merkez Değirmendere-Hasköy Dere Islahı İnşaatı İşi	2017-2017	503.633	257.149	80	Devam ediyor
27	2016 Yılı Muş Merkez Ziyaret Köyü Dere Islahı İnşaatı İşi	2017-2017	838.078	-	20	Devam ediyor
28	2016 Yılı Muş Merkez Kızılağaç Beldesi Dere Islahı İnşaatı İşi	2017-2017	783.478	-	-	Devam ediyor
29	Muş Malazgirt Sulaması Onarımı	2017-2017	200.000	-	-	İhale aşaması
30	Muş 172.Şube Bina Tesisleri Onarımı	2017-2017	330.000	-	-	İhale aşaması
31	Muş-172.Şube Hasköy İlçe Merkezi Taşkın Koruma Tesisleri Onarımı	2017-2017	500.000	-	50	Devam ediyor
32	Muş 172. Şube Taşkın ve Kurutma Tesisleri Onarımı	2017-2018	3.210.000	-	-	İhale aşaması
33	Muş ve Bitlis İlleri Dereleri Yukarı Havza Islahı İstikşaf Raporları Hazırlanması	2017-2018	1.840.000	-	-	İhale aşaması
34	Muş İçmesuyu Tesisleri Proje Yapımı	2015-2017	4.000.000	-	-	İhale aşaması
TOPLAM			856.904.721	366.106.899	58	

DSİ 17. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

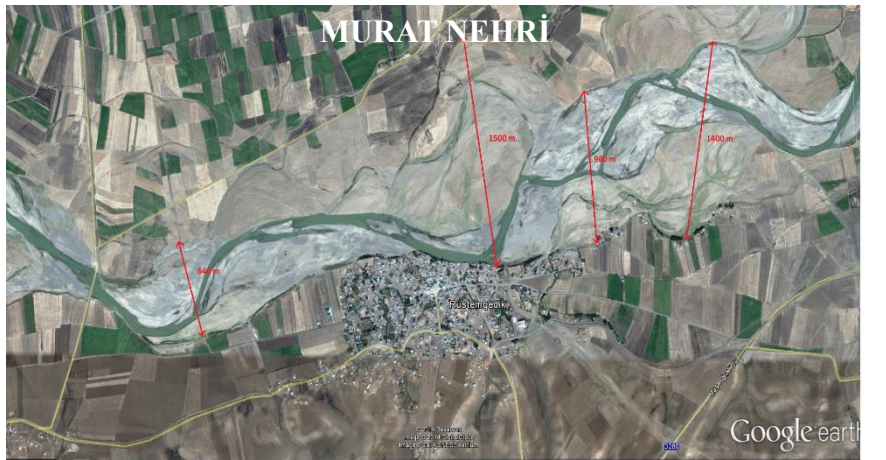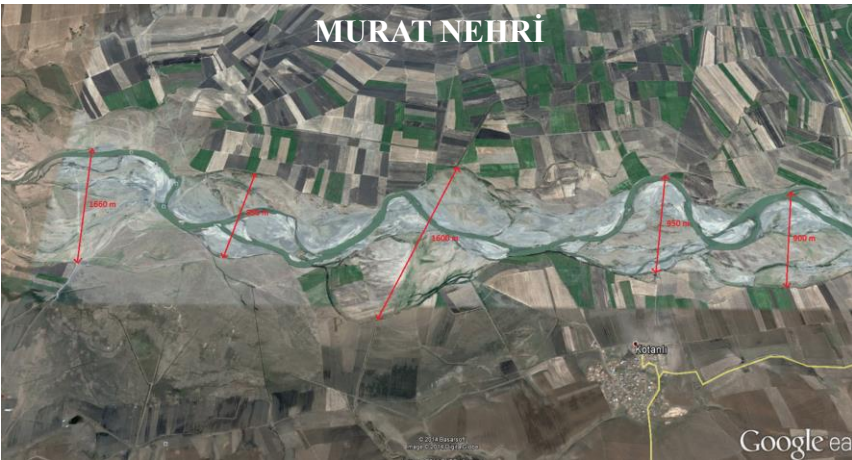

DSİ 17. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ



DSİ 17. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ




KARAYOLLARI 11. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Sıra No	Proje Adı	Başla. ve Bit. Tarihi	Proje Tutarı (TL)	Yapılan Top. Harcma (TL)	Dön. Fiz. Gerç. (%)	Açıklama
1	Bingöl-Solhan-Muş Devlet Yolu BSK Yapımı (DAP)	2013-2020	249.611.000	2.779.000	-	Devam Ediyor
2	Ahlat-Ovakışla-Bulanık Yolu (DAP)	2001-2019	31.300.000	21.731.000	69	Devam Ediyor
3	Ahlat-Karahasan-Malazgirt Yolu (DAP)	2001-2019	51.233.000	33.928.000	66	Devam Ediyor
4	Hasköy-Korkut-Kümbet (DAP)	2005-2019	4.829.000	1.727.000	-	Devam Ediyor
5	Varto-Bulanık (DAP)	2010-2018	34.950.000	3.535.000	15	Devam Ediyor
6	Yoncalı-Adıvar	2010-2018	12.171.000	17.000	-	Devam Ediyor
7	Ahlat-Malazgirt (DAP)	2011-2019	11.865.000	4.278.000	36	Devam Ediyor
8	Varto-Çaylar-Karlıova Ayr.(DAP)	2012-2019	19.800.000	1.127.000	2	Devam Ediyor
9	Patnos-Malazgirt-Bulanık (DAP)	2010-2019	39.349.000	9.000	-	Proje aşaması
10	Çobandere-Hınıs-Varto (DAP)	1977-2020	179.971.000	150.469.000	84	Devam Ediyor
11	Muş- Varto	2016-2019	112.560.000	2.000	-	Devam Ediyor
12	(Muş-Varto) 8. Bölge Hududu Devlet Yolu (Km: 21+000-28+000) Toprak İşleri, Sanat Yapıları ve Üstyapı (Bitümlü Sıcak Karışım Kaplama) İkmal İnşaatı Yapım İşi	2015-2017	20.801.000	11.662.000	57	Devam Ediyor
13	(Muş- Varto) Ayr. 8.Bölge Hududu Yolu (Km: 5+000-18+000 ile 19+000-21+000) Toprak İşleri, Sanat Yapıları ve Üstyapı (Bitümlü Sıcak Karışım Kaplama) İkmal İnşaatı Yapılması İşi.	2013-2017	32.823.000	16.585.000	50	Devam Ediyor
14	Muş-Solhan Ayrımı Varto Devlet Yolu (Km: 16+400-35+988) Üst Yapı Yapım İşi	2016-2017	7.483.000	-	1	Devam Ediyor
15	Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü 280-01KK Nolu Bulanık Şehir Geçişi (Km:0+000-3+500) Arası Toprak İşleri, Sanat Yapıları ve BSK Üstyapı Yapım İşi	2016-2017	9.871.000	4.439.000	45	Devam Ediyor
16	(Muş-Solhan) Ayr.-Muş-Kızılağaç Yolunda Kızılağaç Köprüsü (DAP)	2014-2017	3.559.000	127.000	5	Devam Ediyor
17	Muş-Varto (Relokasyon Ripaj 2 Hattı) yolunda Karataş Gurubu (Karataş ve Koşkar) Köprüleri Yapım İşi	2015-2017	9.430.000	931.000	11	Devam Ediyor
18	Muş İli Malazgirt İlçesinde (DAP) (Kız, Hanım(Hatun) Köprüleri)	2013-2018	200.000	65.000	-	Başlanmadı
19	Rutin Trafik Hizmetleri	2017-2017	6.511.000	837.000	15	Devam Ediyor
20	Ayr. Lice-Kulp-Muş (GAP) (49-75 K.K. Nolu Muş Ayr. Kızılağaç-9.Bölge Hd.) (Km: 10+000-20+000) (Baęalantı yolkarı dahil) İl yolunu toprak işl. sanat yap. ve üst. (BSK) Yapılması yap. işl.	2014-2017	17.429.000	17.429.000	100	Tamamlandı
21	TCK.11.Bölge Müdürlüğü Varto-Bulanık (DAP) il yolu Toprak işleri, Sanat yapıları ve üst yapı işleri yapım işi	2014-2017	6.821.000	6.821.000	100	Tamamlandı
22	2016/160658 İ.KN'li Bitlis İli Günkırı Beldesi Yol Ayrımına Dönel Kavşak Yapılması Yapım İşi	2016-2017	5.824.000	2.747.000	47	Devam Ediyor
23	Performansa Dayalı Sathi Kaplama Yapılması Yapım İşi.	2016-2017	4.309.000	2.190.000	50	Devam Ediyor
TOPLAM			872.700.000	283.435.000	40	

KARAYOLLARI 11. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

BİNGÖL-SOLHAN-MUŞ DEVLET YOLU BSK YAPIMI (DAP)

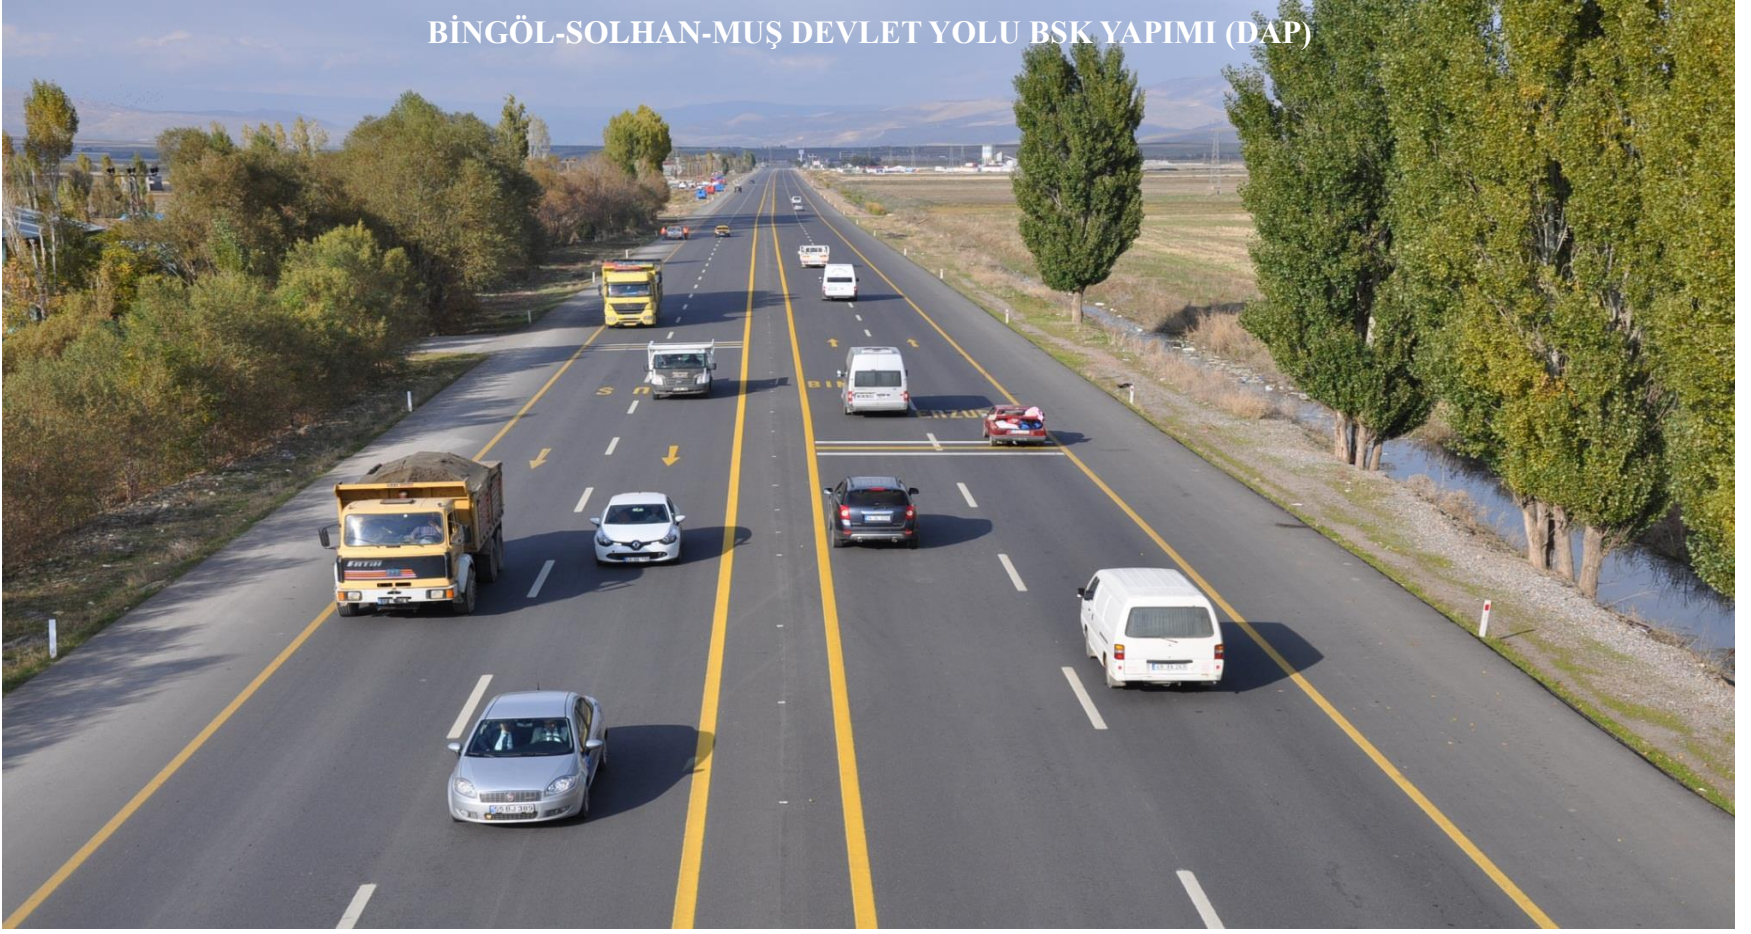

MUŞ ŞEHİR GEÇİŞİ



MUŞ-VARTO KAVŞAĞI



AHLAT-KARAHASAN-MALAZGİRT YOLU



HASKÖY-KORKUT-KÜMBET YOLU



KARAYOLLARI 11. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

VARTO-BULANIK YOLU



PATNOS-MALAZGİRT-BULANIK YOLU



ÇOBANDERE-HINIS-VARTO YOLU



MUŞ-VARTO YOLU



MUŞ-VARTO YOLU



MUŞ-SOLHAN AYRIMI VARTO DEVLET YOLU



MUŞ-KIZILAĞAÇ YOLUNDA KIZILAĞAÇ KÖPRÜSÜ



KARATAŞ KÖPRÜSÜ



KARAYOLLARI 11. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

MUŞ-KIZILAĞAÇ YOLU



MUŞ-KIZILAĞAÇ YOLU



İLLER BANKASI AŞ 13 BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Sıra No	Proje Adı	Başla. ve Bit. Tarihi	Proje Tutarı (TL)	Yapılan Top. Harcama (TL)	Dön. Fiz. Gerç. (%)	Açıklama
1	Muş/Merkez Kanalizasyon, Yağmursuyu ve İçmesuyu İnşaatı	2017-2019	92.848.436	-	-	Devam ediyor
2	Hasköy Kanalizasyon İnşaatı	2012-2014	4.557.352	4.540.692	100	Tamamlandı
3	Altınova Kanalizasyon Şebeke ve Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı	2016-2017	6.207.982	637.455	10	Devam ediyor
4	Yeşilova Kanalizasyon İnşaatı	2016-2016	2.249.509	1.981.801	90	Devam ediyor
5	Elmakaya Kanalizasyon İnşaatı	2016-2017	3.767.000	842.899	22	Devam ediyor
6	Malazgirt İçmesuyu ve Kanalizasyon İnşaatı	2015-2016	42.560.000	-	-	İhale aşaması
7	Sarıpınar Kanalizasyon İnşaatı	2015-2016	4.051.850	-	-	İhale aşaması
8	Bulanık Kanalizasyon İnşaatı	2016-2016	40.520.177	-	-	İhale aşaması
9	Düzkişla Kanalizasyon Şebeke İnşaatı	2016-2017	7.255.328	-	-	İhale aşaması
10	Kızılağaç Yol ve Kaldırım	2016-2017	713.850	494.900	69	Devam ediyor
11	Diğer Küçük Projeler	2015-2017	486.364	97.000	33	Muhtelif
TOPLAM			872.700.000	8.594.747	58	




MUŞ MERKEZ KANALİZASYON, YAĞMURSUYU VE İÇMESUYU İNŞAATI



İLLER BANKASI AŞ 13 BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

HASKÖY KANALİZASYON İNŞAATI

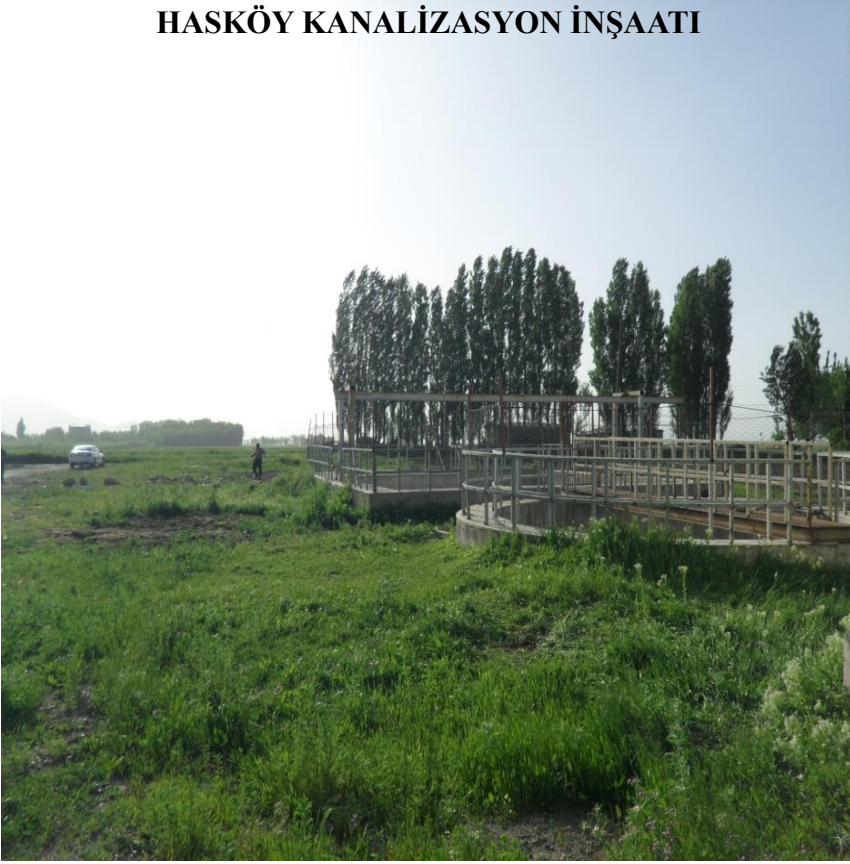

ALTİNOVA KANALİZASYON İNŞAATI



YEŞİLOVA KANALİZASYON İNŞAATI



ELMAKAYA KANALİZASYON İNŞAATI

TEİAŞ 17. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Sıra No	Proje Adı	Başlama ve Bitiş Tarihi	Proje Tutarı (TL)	Yılı Ödeneği (TL)	Dön. Fiz. Gerç. (%)
1	Yukarı Kaleköy Tatvan EİH	2014-2018	54.557.217	18.000.000	30
2	Alparslan I HES Yurt Çim EİH	2014-2018	135.000	13.000	-
TOPLAM			54.692.217	18.013.000	30



MTA DOĐU ANADOLU BÖLGE MÜDÜRLÜĐÜ

Sıra No	Proje Adı	Başla. ve Bit. Tarihi	Proje Tutarı (TL)	Yapılan Top. Harcma (TL)	Dön. Fiz. Gerç. (%)	Açıklama
1	Muş İli Neojen Havzaları Kömür Aramaları Enerji Hammaddesi	2017-2017	10.406.000	1.673.097	20	Devam ediyor
TOPLAM			10.406.000	1.673.097	20	



TAPU VE KADASTRO XV. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Sıra No	Proje Adı	Başla. ve Bit. Tarihi	Proje Tutarı (TL)	Yapılan Top. Harcama (TL)	Dön. Fiz. Gerç. (%)	Açıklama
1	Muş 22-a Yenileme Paketi (MUŞ-HSK)	2017-2017	1.113.863	333.895	30	Devam ediyor
TOPLAM			1.113.863	333.895	30	



TCDD 5. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Sır No	Proje Adı	Baş. ve Bit. Tarih	Proje Tutarı (TL)	Yapılan Top. Harcma (TL)	Dön. Fiz. Ger. (%)	Açıklama
1	Muş-Tatvan İstasyonları Arası Yol Yenileme Tamaml. İşl.	2016-17	3.674.790	1.420.866	40	Devam ediyor
2	Diyarbakır, Batman, Van, Muş, Bingöl ve Tatvan da Bulunan Güvenlik Kamera Sistemlerinin IP Tabanlı Sisteme Dönüştürülmesi İşİ	2017-17	241.708	-	-	İhale aşaması
3	5.Bölge Müdürlüğünde 40 Adet Hemzemin Geçitte Kaplama Yapılması (5 Adet)	2016-17	169.686	168.815	100	Tamamlandı
4	5.Bölge Müdürlüğünde 45 km İstasyon Yolu Yenilenmesi (4.050 M)	2017-17	1.350.000	47.761	5	Devam ediyor
5	5. Bölge Müdürlüğü Mıntıkasında 10 Adet Hemzemin Geçide Makinist Uyarı Sinyali Yapılması	2017-17	144.018	-	-	Başlanmadı
6	5. Bölge Müdürlüğü Mıntıkasında 5 Adet Hemzemin Geçide Koruma Sistemi Kurulması	2017-17	242.592	-	-	Başlanmadı
7	Malatya-Tatvan Arası Mevcut Geniş Alan Kaplama Sisteminin, İnternet Alt Yapısı Kullanılarak İyileştiril.	2017-17	120.125	-	-	İhale aşaması
8	Palu-Genç-Muş Demiryolu Deplasmanı İkmal İnşaatı	2016-17	168.990.216	103.132.887	55	Devam ediyor
9	Palu-Genç-Muş Demiryolu Deplasmanı Kontr. Hiz.	2016-17	999.550	276.191	55	Devam ediyor
10	Diğer Küçük Projeler	2016-17	50.175	36.585	-	Muhtelif
TOPLAM			175.932.685	105.083.105	47	



İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ (TARIM SEKTÖRÜ)

Sıra No	Proje Adı	Baş. ve Bit. Tarih	Proje Tutarı (TL)	Yapılan Top. Harcama (TL)	Dön. Fiz. Ger. (%)	Açıklama
1	Taşoluk Köyü İçme Suyu Bakım ve Onarımı İşi	2017-2017	150.000	-	-	Başlanmadı
2	Karakuyu Köyü İçme Suyu Tesis Geliştirme İşi	2017-2017	100.000	-	-	Başlanmadı
3	Yücestepe Köyü Tesis Geliştirme İşi	2017-2017	250.000	-	-	Başlanmadı
4	Samanyolu, Şehittahir ve Sıradere Grup Köyleri İçme Suyu Yapım İşi	2017-2017	5.000.000	-	-	Başlanmadı
5	Kapılı Köyü İçme Suyu Tesis Geliştirme İşi	2017-2017	100.000	-	-	Başlanmadı
6	Tatargazi Köyü İçme Suyu Tesis Geliştirme İşi	2017-2017	130.000	-	-	Başlanmadı
7	Mollabaki Köyü İçme Suyu Bakım ve Onarımı işi	2017-2017	120.000	-	20	Devam ediyor
8	Sertifikalı Meyve Fidanı Alımı	2017-2017	230.000	247.392	100	Tamamlandı
9	Kıyıbaşı Köyü Kanalizasyon ve Fosseptik İnşaatı İşi	2017-2017	250.000	-	10	Devam ediyor
10	Donatım Köyü Kanalizasyon ve Fosseptik İnşaatı İşi	2017-2017	250.000	-	10	Devam ediyor
11	Beşçatak Köyü Kanalizasyon ve Fosseptik İnşaatı İşi	2017-2017	500.000	-	-	Devam ediyor
12	Karakale Köyü Kanalizasyon ve Fosseptik İnşaatı İşi	2017-2017	500.000	-	-	Başlanmadı
13	Elmabulak Köyü Kanalizasyon Yapım İşi	2017-2017	1.167.307	439.445	90	Devam ediyor
14	Dilimli Köyü Sulama Havuzu Bakım ve Onarımı İşi	2017-2017	100.000	-	-	Başlanmadı
15	Karakuyu Köyü Sulama Tesisi Bakım ve Onarımı İş	2017-2017	100.000	-	-	Başlanmadı
16	Merkez Alaniçi Köyü Kapalı Sistem Sulama Tesisi Yapım İşi (DAP Programı)	2017-2017	905.000	920.272	95	Devam ediyor
17	Merkez Üçsirt Köyü His Göleti Yapım İşi (DAP Programı)	2017-2017	335.358	-	20	Devam ediyor
18	Karabey Köyü Çakmak Mezrası içme suyu tesisi yapımı	2017-2017	150.000	-	-	Başlanmadı
19	İnardı Köyü Konak Balcılar Güvendik Danacık Mezraları içme suyu tesis yapımı	2017-2017	270.000	-	-	Başlanmadı
20	Arı Köyü Yıldızlı Mez. içmesuyu tesis yapımı	2017-2017	150.000	-	-	Başlanmadı
21	Derecik Köyü Bakraç-Tütünlü, Ozan, ve Varlık içme suyu tesisi yapımı	2017-2017	200.000	-	-	Başlanmadı

İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ (TARIM SEKTÖRÜ)


Sıra No	Proje Adı	Baş. ve Bit. Tarih	Proje Tutarı (TL)	Yapılan Top. Harcama (TL)	Dön. Fiz. Ger. (%)	Açıklama
22	Harman Köyü içme suyu tesis geliştirme	2017-2017	100.000	-	-	İhale aşaması
23	Üçevler Köyü Çavuştepe ve Kilise mahallesine içme suyu tesis geliştirme	2017-2017	100.000	-	-	İhale aşaması
24	Bağlar Köyü Karşıyaka Mah. içme suyu tesis geliştirme	2017-2017	100.000	-	-	İhale aşaması
25	Cevizlidere Köyü içmesuyu tesis geliştirme	2017-2017	150.000	-	-	Başlanmadı
26	Tandoğan köyü içme suyu bakım onarım	2017-2017	100.000	-	20	Devam ediyor
27	Ağrı Köyü Dursunlu, Yeşil, Kamışlı, Perşembe Mezraları	2017-2017	150.000	-	-	Başlanmadı
28	Ekindüzü Köyü İçme Suyu Bakım Onarımı	2017-2017	100.000	-	-	Başlanmadı
29	Güzeltepe Köyü Tesis Geliştirme	2017-2017	100.000	-	-	Başlanmadı
30	Beşparmak Köyü Soğuksu Mez. İçme Suyu Tesis Geliştirme	2017-2017	100.000	-	-	İhale aşaması
31	Adıvar, Yazbaşı, Samanyolu, Şehittahir ve Sıradere Köyleri	2017-2017	100.000	-	-	Başlanmadı
32	Okçular Köyü	2017-2017	110.000	-	-	Başlanmadı
33	Kıryaka Köyü İçme Suyu Tesis Geliştirme	2017-2017	110.000	-	-	Başlanmadı
34	Yolgözler Köyü ve Özçimen Mez. İçmesuyu	2017-2017	150.000	-	-	İhale aşaması
35	Bahçe Köyü Konutlar Mezrası İçme Suyu	2017-2017	150.000	-	-	Başlanmadı
36	Zorabat Köyü İçme Suyu	2017-2017	230.000	-	-	İhale aşaması
37	Karameşe Köyü Ziyaret ve Yıldızlar Mez. İçme Suyu	2017-2017	140.000	-	-	Başlanmadı
38	Üçtepe Köyü Kanalizasyon Yapım İşi	2017-2017	208.738	-	-	Başlanmadı
39	Ericcek Köyü Kanalizasyon Yapım İşi	2017-2017	115.000	-	-	Başlanmadı
40	Gülkoru Köyü İçme Suyu Tesis Geliştirme İşi	2016-2017	565.220	-	-	Devam ediyor
41	Diğer Küçük Projeler (100 Proje)	2017-2017	4.991.182	83.685	-	Muhtelif
	TOPLAM		18.827.805	1.690.794	33	

İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ (TARIM SEKTÖRÜ)

DONATIM KÖYÜ KANALİZASYON VE FOSSEPTİK İNŞAATI İŞİ




DONATIM KÖYÜ KANALİZASYON VE FOSSEPTİK İNŞAATI İŞİ

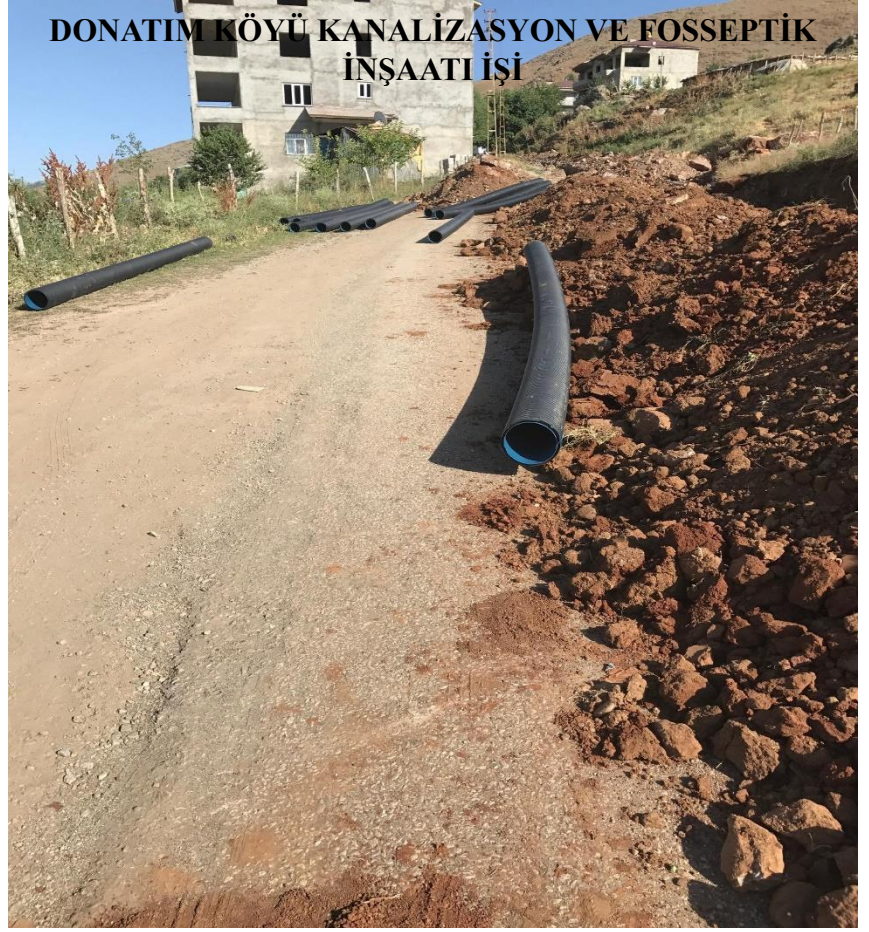

DÖNERTAŞ KÖYÜ DOĞAL ARITMA TESİSİ



DÖNERTAŞ KÖYÜ DOĞAL ARITMA TESİSİ

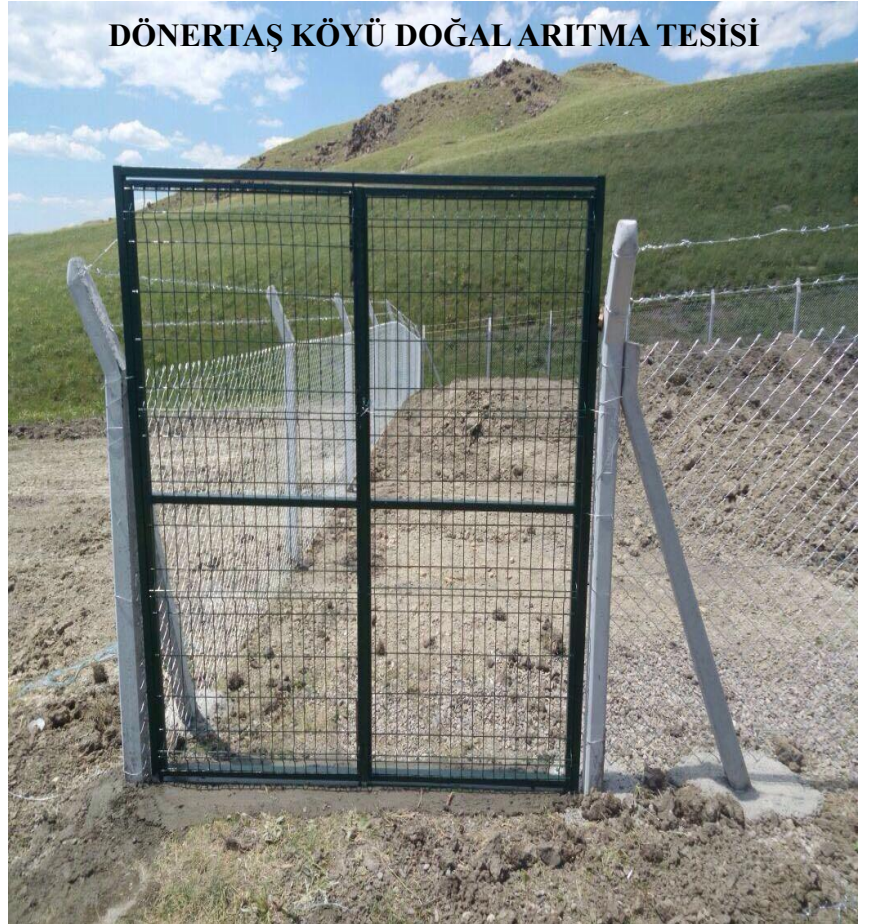

İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ (ULAŞTIRMA SEKTÖRÜ)

Sıra No	Proje Adı	Baş. ve Bit. Tarih	Proje Tutarı (TL)	Yapılan Top. Harcma (TL)	Dön. Fiz. Ger. (%)	Açıklama
1	Yelalan Köy Yolu 3.7 km BSK	2017-2017	400.000	-	-	Başlanmadı
2	DY-İlt-Kıyık-Çatbaşı Yol Ayrımı BSK (2 km)	2017-2017	450.000	-	-	Başlanmadı
3	Çöğürlü-Üçdere Grup Köy Yolu BSK (4.6 Km)	2017-2017	1.035.000	-	-	Başlanmadı
4	Dy. Ayr-Yarpuzlu-Tandoğan-Dy. Ayr.BSK (4.3 Km)	2017-2017	967.500	-	-	Başlanmadı
5	Sürügüden Köy Yolu 1.kat asfalt (9.1 Km)	2017-2017				
6	Yazla Köy Yolu 1.kat asfalt (1.5 Km)	2017-2017	745.422	222.000	80	Devam ediyor
7	Kepenek Köy Yolu 1.kat asfalt (1.5 Km)	2017-2017				
8	Özdilek köy yolu 1.kat asfalt (4 Km)	2017-2017	373.999	-	30	Devam ediyor
9	Toprakkale köyü mezraları 1.kat asfalt(3 Km)	2017-2017	285.000	-	30	Devam ediyor
10	Derecik-Ilıca-Ağıllı Grup Köy Yolu 2. kat asfalt (38.5)	2017-2017	969.420	-	55	Devam ediyor
11	Dumulusu-Akkonak Köy Yolu 2. kat asfalt (8.5 Km)	2017-2017				
12	Beşparmak Köy Yolu 2. kat asfalt (5.3 Km)	2017-2017	780.984	172.000	65	Devam ediyor
13	Bozbulut Köy Yolu 2. kat asfalt (4 Km)	2017-2017				
14	Boyuncuk- Ayranlı- Aş. Sızma-Çiçekli-Y. Sızma-Sarıdal Grup Köy Yolu 2. kat asfalt (16.6 Km)	2017-2017				
15	Cevizlidere-Üçteveler Grup Köy Yolu 1.kat asfalt (11.5 Km)	2017-2017	1.100.000	-	-	Başlanmadı
16	Arıköy Köy Yolu 2. kat asfalt (5.8 Km)	2017-2017	145.000	-	-	Başlanmadı
17	Dy. Ayr.-Erencik Köy Yolu 2. kat asfalt(4 Km)	2017-2017	100.000	-	-	Başlanmadı
18	Kepenek-Derecik Arası köprü	2017-2017	250.000	-	-	Başlanmadı
19	Soğucak Köyü Köprü	2017-2017				
20	Güzeltepe köyü sanat yapısı	2017-2017	75.756	-	-	İhale aşaması
21	Suvaran Köyü sanat yapısı	2017-2017				
22	Sudurağı-Tüten-Kutlugün Grup Köy Yolu sanat yapıları	2017-2017	150.000	-	-	Başlanmadı
23	Derecik Köyü Tütünlü Mezrası Köprü	2017-2017	300.000	-	-	Başlanmadı

İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ (ULAŞTIRMA SEKTÖRÜ)

Sıra No	Proje Adı	Baş. ve Bit. Tarih	Proje Tutarı (TL)	Yapılan Top. Harcma (TL)	Dön. Fiz. Ger. (%)	Açıklama
24	Alagün köyü Köprü	2017-2017	150.000	-	-	Başlanmadı
25	Karakuyu Köyü Köprü	2017-2017	35.046	-	-	Devam ediyor
26	Yoncalıöz Köyü Sanat yapısı	2017-2017				
27	İnardı Köyü Mezraları Sanat yapıları	2017-2017	100.000	-	-	Başlanmadı
28	İnardı Köyü sanat yapıları	2017-2017	120.000	-	-	Başlanmadı
29	Sarıpınar-Sıradere Köy yolu 1.kat asfalt (10 Km)	2017-2017	1.762.200	-	30	Devam ediyor
30	Göztepe-Gölyanı Arası 2.kat asfalt (3.2 Km)	2017-2017				
31	Molladavut Köy yolu 2.kat asfalt (10.7 Km)	2017-2017				
32	Sultanlı Köy Yolu 2.kat asfalt (4 Km)	2016-2017				
33	Koyunağılı Köy Yolu 2.kat asfalt (2.5 Km)	2017-2017				
34	Karaağıl-Değirmensuyu-Karacaören-Şehitveren-Toklular-Altınoluk Grup Köy Yolu 1.kat asfalt (11 Km)	2017-2017	1.737.200	-	-	Devam ediyor
35	Örenkent-Gölyanı-Göztepe Grup Köy Yolu 1.kat asfalt (3.5 Km)	2017-2017				
36	Gümüşpınar-Çaygeldi-Elmakaya grup köy yolu 2.kat asfalt (2 Km)	2017-2017				
37	Olurdere köy yolu 2.kat asfalt (3.5 Km)	2017-2017				
38	Karaağıl köy yolu 2.kat asfalt (1 Km)	2017-2017				
39	Yazbaşı Köy Yolu 2.kat asfalt (4 Km)	2017-2017				
40	Bostancılar Köy Yolu 2.kat asfalt (3.5 Km)	2017-2017				
41	Sarıpınar-Karaağıl arası köprü	2017-2017	100.000	-	-	Başlanmadı
42	Kurganlı köy yolu 1. kat asfalt (4 Km)	2017-2017	285.000	-	-	Başlanmadı
43	Şatırlar köy içi Parke	2017-2017	100.000	-	-	Başlanmadı
44	Üçtepe köy içi Parke	2017-2017	100.000	-	-	Başlanmadı
45	Balotu köy içi Parke	2017-2017	100.000	-	-	Başlanmadı
46	Göztepe köy içi Parke	2017-2017	100.000	-	-	Başlanmadı
47	Örenkent köy içi Parke	2017-2017	100.000	-	-	Başlanmadı

İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ (ULAŞTIRMA SEKTÖRÜ)

Sıra No	Proje Adı	Baş. ve Bit. Tarih	Proje Tutarı (TL)	Yapılan Top. Harcma (TL)	Dön. Fiz. Ger. (%)	Açıklama
48	Kırkgöze Köy İçi Parke	2017-2017	100.000	-	-	Başlanmadı
49	Arakonak Köy İçi Parke	2017-2017	100.000	-	-	Başlanmadı
50	Karakütük-böğürdelen-otaç Grup Köy Yolu BSK (2.7 Km)	2017-2017	500.000	-	-	Başlanmadı
51	Azıklı Köyü Köy İçi 1. Kat Asfalt (2 Km)	2017-2017	200.000	-	-	Başlanmadı
52	Hasköy İlçesine Bağlı 14 Köy Köy İçi Kilitli Parke Taşı Yapım İşi	2017-2017	428.272	-	-	Başlanmadı
53	İçboğaz -Alidino Mezrası Yolu 1.Kat Asfalt (5 Km)	2017-2017	521.400	-	-	Devam ediyor
54	Demirci-kaval-doğular-çakırlı Grup Köy Yolu 1.Kat Asfalt (4 Km)	2017-2017	226.330	-	-	Başlanmadı
55	Pınarüstü Köyü-korkut Yol Ayrımı 1.Kat Asfal (3.5 Km)	2017-2017	150.000	-	-	Başlanmadı
56	Demirci Köyü Kaval-doğular Mezra Yolu 1.Kat Asfalt (8 Km)	2017-2017	370.000	-	-	Başlanmadı
57	Konakkuran - Sırtüzü - Beşdam Grup Köy Yolu 1. Kat Asfalt (18 Km)	2017-2017	1.742.907	-	-	Başlanmadı
58	Mağalcık Köyü 1. Kat Asfalt (3 Km)	2017-2017	300.000	-	-	Başlanmadı
59	Hanoğlu-çayırdere Köy Yolu 2.Kat Asfalt (7 Km)	2017-2017	210.000	-	-	Başlanmadı
60	Bezirhane-güzelbaba-karadere Grup Köy Yolu 1. Kat Asfalt (8 Km)	2017-2017	1.604.800	-	25	Devam ediyor
61	Akören-tatargazi Köy Yolu 2.Kat Asfalt (3 Km)	2017-2017				
62	Hasretpınar Köy Yolu 2.Kat Asfalt (6 Km)	2017-2017				
63	Odaköy-molladreman Arası 2.Kat Asfalt (3 Km)	2017-2017				
64	Dolabaş-tatlıca Arası 2.Kat Asfalt (3.4 Km)	2017-2017				
65	Aktuzla-karınçalı-iyikomşu Grup Köy Yolu Bitümlü Sıcak Kaplama (7,5 Km)	2017-2017	2.146.305	1.347.135	60	Devam ediyor
66	Buzlugöze-haksever-hüseyinoğlu-dutözü-karameşe-karameşe Yıldız Mez. Grup Köy Yolu BSK (8 Km)	2017-2017	1.660.981	2.098.093	-	Başlanmadı
67	Dy. İlt.Güzelkent-özkonak-yılanlı-çayçatı-güllüce-kolan Grup Köy Yolu 1.Kat Asfalt (18 Km)	2017-2017	2.673.249	-	-	Devam ediyor
68	Baltaş-Gelintaş-Göltepe Grup Köy Yolu 2.Kat Asfalt (15.5 Km)	2017-2017	387.500	-	-	Başlanmadı
69	Diğer Küçük Projeler (42 Proje)	2017-2017	1.917.162	-	-	Muhtelif
TOPLAM			28.156.433	3.839.228	-	

İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ (ULAŞTIRMA SEKTÖRÜ)



İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ (DKH SEKTÖRÜ)

Sıra No	Proje Adı	Baş. ve Bit. Tarih	Proje Tutarı (TL)	Yapılan Top. Harcma (TL)	Dön. Fiz. Ger. (%)	Açıklama
1	Muş Merkez Eski Ticaret Lisesi 24 Derslik Yanına SYDV 200 Kişilik Kız Öğrenci Yurdu Yapım işi ve Çevre Düz İş	2016-2017	3.291.551	2348.221	80	Devam ediyor
2	Muş Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne Bağlı Çocuk Evleri Yapımı ve Çevre Düzenlemesi İş	2017-2018	4.479.044	-	10	Devam ediyor
3	Muş İl Jandarma Komutanlığı Birliklerine Ait 15 Adet Jeneratörhane Binası ve Kablolama Yapımı İş	2017-2017	838.440	-	10	Devam ediyor
4	Muş Sungu Tekstil Kent Hizmet Binaları İle Konukbekler OSB İhata Duvarı Yapım İş (DAKA İle Yapılan Protokol Gereği)	2016-2017	4.904.965	4.844.257	100	Tamamlandı
5	Muş 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü Hizmet (B+Z+2 Kat) Binası Yapımı ve Çevre Düzenlemesi	2016-2018	5.927.140	2.586.807	50	Devam ediyor
6	Vali Konağı Yapım İş	2015-2017	-	-	-	Proje aşaması
7	Muş İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğüne Prefabrik Bina Yapım İş	2016-2017	247.800	247.800	100	Tamamlandı
8	Muş İl Jandarma Komutanlığı 13 Adet Elektrik Ana Dağıtım Panosu Yapım İş	2017-2017	253.700	-	20	Devam ediyor
9	Muş İl Jandarma Komutanlığı Hizmet ve Sosyal Tesis Binası Onarım İş	2017-2017	136.414	-	70	Devam ediyor
10	Muş İl Jandarma Komutanlığı (a,b,c,ç,d 5 Adet) 10 Daireli Lojman Binalarının Onarımı İş	2017-2017	499.730	-	30	Devam ediyor
11	Muş Malazgirt Aktuzla Jandarma Komutanlığı İhata Duvarı Yapımı ve Çevre Düzenlemesi İş	2016-2017	513.300	349.015	80	Devam ediyor
12	Muş İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne 12 Kalemden Oluşan IP CCTV İş	2017-2017	140.420	140.420	100	Tamamlandı
13	Muş İl Özel İdaresine Bağlı Hizmet Binalarının Zemin Etüt ve Depremsellik Raporlarının Hazırlanması İş	2017-2017	108.713	108.713	100	Tamamlandı
14	Diğer Projeler (31 Proje)	2017-2017	823.500	823.500	-	Muhtelif
TOPLAM			22.164.717	10.625.233		

İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ (DKH SEKTÖRÜ)

ÇOCUK EVLERİ SİTESİ TASARIM



ÇOCUK EVLERİ SİTESİ İNŞAATI



112 ACIL ÇAĞRI MERKEZİ İNŞAATI



MERKEZ SYDV 200 KİŞİLİK KIZ ÖĞRENCİ YURDU



TEKSTİLKENT



TEKSTİLKENT



İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ (EĞİTİM SEKTÖRÜ)


Sıra No	Proje Adı	Baş. ve Bit. Tarih	Proje Tutarı (TL)	Yapılan Top. Harcama (TL)	Dön. Fiz. Ger. (%)	Açıklama
1	Bulanık Şatırlar Köyü 2 Derslikli Okul Yapımı ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi	2016-2017	436.600	155.597	45	Devam ediyor
2	Bulanık Sultanlı Köyü 5 Derslikli Okul Binası Yapımı + Mevcut 2 Binanın Onarımı ve Çevre Düzenleme İşi	2017-2017	1.410.525	-	-	Devam ediyor
3	Hasköy Dağdibi Köyü 12 Derslikli Okul Binası Yapımı ve Çevre Düzenlemesi İşi	2017-2017	2.128.847	-	10	Devam ediyor
4	Korkut Oğulbalı 8 Derslikli Okul (Z+1) + Isı Merkezi Yap+ Mevcut 3 Binanın Yıkm + 2 Bina Onar ve Çev Düzenle. İşi	2017-2017	1.325.966	-	20	Devam ediyor
5	Malazgirt 16 Derslikli İmam Hatip Orta Okulu Binası ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi	2015-2017	3.317.040	3.214.753	100	Tamamlandı
6	Muş Merkez Tandoğan Köyü 8 Derslikli Okul (Z+1) + Isı Merkezi Yapımı ve Çevre Düzenlemesi İşi	2017-2017	1.322.662	171.061	25	Devam ediyor
7	Muş Merkez Ortakent Köyü 8 Derslikli Okul (Z+1) + Isı Merkezi + Mevcut Okulların Onarımı ve Çevre Düzenlemesi İşi	2017-2017	1.537.894	-	10	Devam ediyor
8	Muş Merkez Mehmet Akif Ersoy 24 Derslikli Okul Binası Yapımı, Mevcut Binanın Yıkımı ve Çevre Düzenlemesi İşi	2017-2018	2.552.340	-	10	Devam ediyor
9	Muş Merkez Prof. Dr. Vahit Özmen İlk ve Ort. Onr. İşi	2017-2017	147.500	147.500	100	Tamamlandı
10	Muş Merkez Prof. Dr. Vahit Özmen 14 Derslikli Okul Genel Onarım İşi	2017-2017	189.980	188.830	100	Tamamlandı
11	Bulanık 24 Derslikli Mesleki ve Teknik Lise Yapımı ve Çevre Düzenlemesi İşi	2016-2018	5.933.040	812.579	20	Devam ediyor
12	Bulanık 12 Derslikli Halk Eğitim Merkezi (B+Z+4 Kat) Binası Yapımı ve Çevre Düzenlemesi İşi	2015-2017	2.954.720	1.740.695	70	Devam ediyor
13	Malazgirt İmam Hatip Lisesi 300 Kişilik Öğrenci Pansiyonu Yapım İşi ve Çevre Düzenlemesi İşi	2015-2017	3.974.240	3.498.715	95	Devam ediyor
14	Malazgirt Anadolu Lisesi 32 Derslik + 300 Kişilik Öğrenci Pansiyonu + 16 Daireli Lojman İnş. Yapım İşi	2016-2018	14.551.288	12.110.237	90	Devam ediyor
15	Muş Merkez Bostankent Köyü ÇPL 12 Derslikli Okul İnşaatı Yapımı ve Çevre Düzenlemesi İşi	2015-2017	4.649.200	3.425.004	80	Devam ediyor
16	Muş Merkez 24 Derslikli Kız İmam Hatip Lisesi + 200 Kişilik Pansiyon Binası ve Çev. Düz. İnşaatı Yapım İşi	2016-2017	8.506.136	5.442.527	70	Devam ediyor
17	Muş Merkez 32 Derslikli Anadolu Lisesi Ek Bina İnşaatı Yapım ve Çevre Düzenlemesi İşi	2016-2017	7.144.061	7.144.061	100	Tamamlandı
18	Muş Hasköy ÇPL 24 Derslikli Okul + 200 Kişilik Öğrenci Pansiyonu Binasının Projelerinin Revize Edilerek Hazırlanması Hizmet Alımı	2017-2017	162.500	162.500	100	Tamamlandı
19	Muş Merkez Spor Lisesi 16 Derslikli Okul + 200 Kişilik Öğrenci Pansiyonu + Spor Salonu Binalarının Projelerinin Revize Edilerek Hazırlanması Hiz. Alımı	2017-2017	188.009	188.009	100	Tamamlandı
20	Diğer Küçük Projeler (84 Proje)	2017-2017	1.039.243	1.039.243	-	Muhtelif
TOPLAM			28.156.433	3.839.228	-	

İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ (EĞİTİM SEKTÖRÜ)

MALAZGİRT ANADOLU LİSESİ 32 DERSLİK



**MALAZGİRT ANADOLU LİSESİ 16 DAİRELİ
LOJMAN**

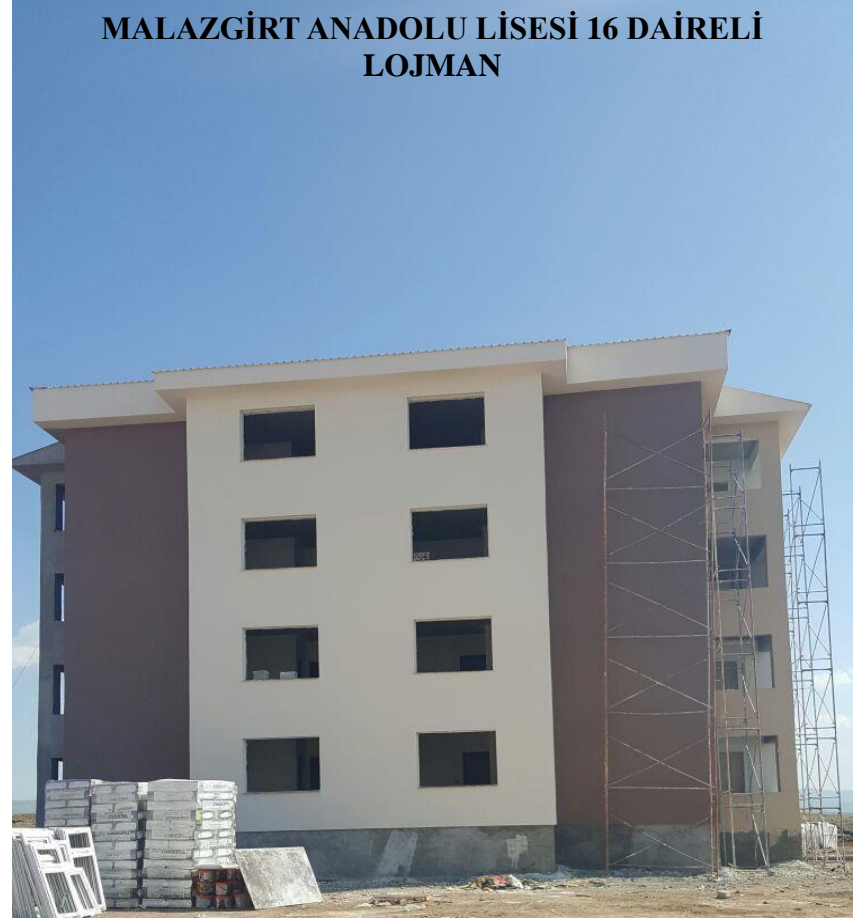

**MALAZGİRT ANADOLU LİSESİ 300 KİŞİLİK
ÖĞRENCİ PANSİYONU**



**MALAZGİRT 16 DERSLİKLİ İMAM HATİP ORTA
OKULU BİNASI**



**MERKEZ BOSTANKENT KÖYÜ ÇPL 12 DERSLİKLİ
OKUL İNŞAATI**



MERKEZ TANDOĞAN KÖYÜ 8 DERSLİKLİ OKUL



**MALAZGİRT İMAM HATİP LİSESİ 300 KİŞİLİK
ÖĞRENCİ PANSİYONU YAPIM İŞİ**



KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ



Sıra No	Proje Adı	Baş. ve Bit. Tarih	Proje Tutarı (TL)	Yapılan Top. Harcma (TL)	Dön. Fiz. Ger. (%)	Açıklama
1	50 Yataklı Hasköy Devlet Hastanesi (İhale aşamasında)	2017-	-	-	-	İhale aşaması
2	50 Yataklı Yeni Malazgirt Devlet Hastanesi	2017-	14.100.000	-	-	Proje aşaması
3	Muş Devlet Hastanesi Çevre Düzenlemesi Yapım İşİ	2017-2017	250.000	-	-	İhale aşaması
TOPLAM			14.350.000	-	-	

HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

Sıra No	Proje Adı	Baş. ve Bit. Tarih	Proje Tutarı (TL)	Yapılan Top. Harcma (TL)	Dön. Fiz. Ger. (%)	Açıklama
1	Halk Sağlığı Laboratuvar Binası	2016-2017	2.500.000	-	-	Başlanmadı
2	Erentepe Aile Sağlığı Merkezi.112 Acil Sağlık İstasyonu	2016-2017	1.250.000	-	-	Başlanmadı
3	Toplum Sağlığı Merkezi. Aile Sağlığı Merkezi.112 Acil Sağlık İstasyonu	2016-2017	2.500.000	-	-	Başlanmadı
4	Merkez 2 Nolu Aile Sağlığı Merkezi+112 ASH	2016-2017	800.000	-	-	Başlanmadı
5	Nurettin Köyü Sağlık Evi	2016-2017	225.000	-	-	Başlanmadı
6	Merkez 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi+112 ASH	2016-2017	2.500.000	-	-	Başlanmadı
7	Toplum Sağlığı Merkezi. Aile Sağlığı Merkezi.112 Acil Sağlık İstasyonu	2016-2017	2.500.000	-	-	Başlanmadı
TOPLAM			12.275.000	-	-	

İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ

Sıra No	Proje Adı	Baş. ve Bit. Tarih	Proje Tutarı (TL)	Yapılan Top. Harcama (TL)	Dön. Fiz. Ger. (%)	Açıklama
1	Hayvancılığı Geliştirme Projesi	2017-2017	102.904	19.288	19	Devam ediyor
2	Muş ilinde Ceviz Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi	2017-2017	260.000	256.465	100	Tamamlandı
3	Hayvan Hastalık ve Zararlılarla Mücadele İçin Malzeme Alımı Projesi	2017-2017	150.000	-	-	Devam ediyor
4	Muş İli Havza Bazlı Ceviz Yetiştiriciliği Projesi	2017-2017	200.000	180.000	100	Tamamlandı
5	Arazi Topplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri	2009-2017	71.034.207	41.826.631	59	Devam ediyor
6	Diğer Küçük Projeler (26 Proje)	2017-2017	700.151	426.170	-	Muhtelif
TOPLAM			72.447.262	42.708.554	62	Başlanmadı

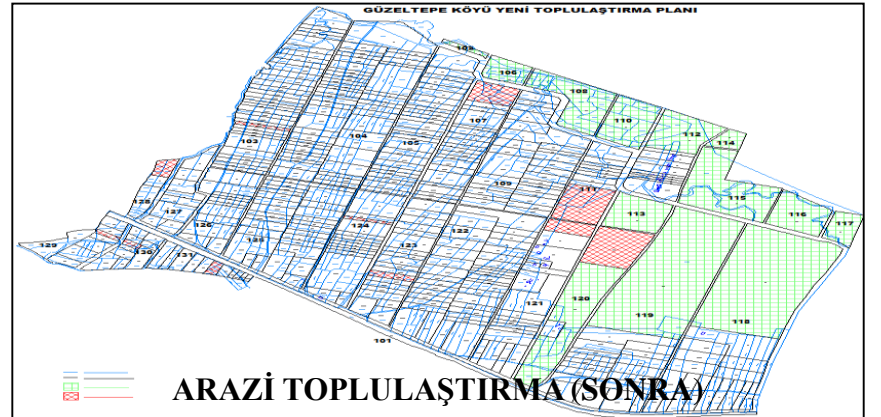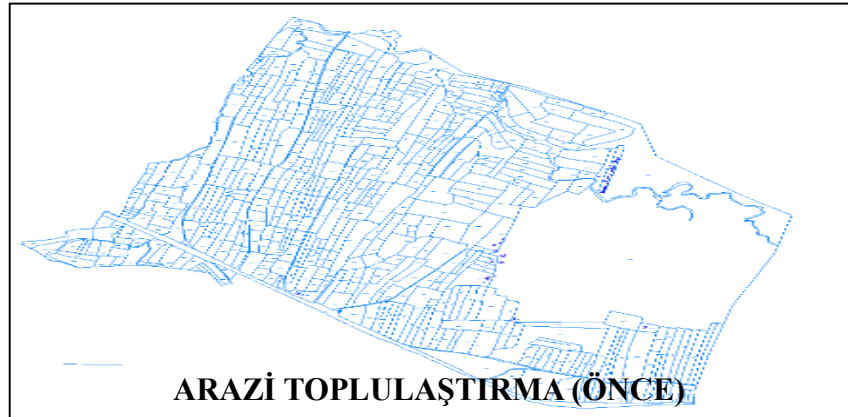

İL ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Sıra No	Proje Adı	Başlama ve Bitiş Tarihi	Proje Tutarı (TL)	Yapılan Harcama (TL)	Dön. Fiz. Gerç. (%)	Açıklama
1	Tarım Sitesi (İnşaat)	2015-2017	8.500.000	1.961.892	35	Devam ediyor
2	Muş-Bulanık Hoşgeldi Köyü K.E.Y.Y. Metoduyla 28 Ad.Konut Yap.İşi	2015-2017	1.509.360	610.800	30	Devam ediyor
3	Muş-Bulanık Doğanstepe Köyü K.E.Y.Y. Metoduyla 11 Adet Konut Yap.İşi	2017-2017	703.000	8.550	10	Devam ediyor
4	Diğer Küçük Projeler	2017-	-	-	-	Muhtelif
TOPLAM			10.712.360	2.581.242	25	

TARIM SİTESİ (İNŞAAT)



TARIM SİTESİ (İNŞAAT)



MUŞ-BULANIK HOŞGELDİ KÖYÜ K.E.Y.Y. METODUYLA 28 AD.KONUT YAP.İŞİ



MUŞ-BULANIK DOĞANTEPE KÖYÜ K.E.Y.Y. METODUYLA 11 ADET KONUT YAP.İŞİ



GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Sıra No	Proje Adı	Başlama ve Bitiş Tarihi	Proje Tutarı (TL)	Yapılan Harcama (TL)	Dön. Fiz. Gerç. (%)	Açıklama
1	Muş Şehir Stad Tribünü Yapılması	2016-2017	4.500.000	2.537.881	55	Devam ediyor
2	Diğer Projeler (4 Proje)	2017-	13.250.000	-	-	Proje aşaması
TOPLAM			17.750.000	2.537.881	55	



AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ


Sıra No	Proje Adı	Başlama ve Bitiş Tarihi	Proje Tutarı (TL)	Yapılan Harcama (TL)	Dön. Fiz. Gerç. (%)	Açıklama
1	Hasköy Engelsiz Yaşam Merkezi (73 Kişilik)	2016-2018	8.100.000	-	-	İhale aşaması
TOPLAM			8.100.000	-	-	

İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ

Sıra No	Proje Adı	Başlama ve Bitiş Tarihi	Proje Tutarı (TL)	Yapılan Harcama (TL)	Dön. Fiz. Gerç. (%)	Açıklama
1	Muş Korkut Çalaplı Köyü Afet Konutları (27 Adet) Çevre Düzenlemesi ve Kanalizasyon Yapım İşİ	-	250.000	-	-	Başlanmadı
TOPLAM			250.000	-	-	

MUŞ HAVA MEYDAN MÜDÜRLÜĞÜ

Sıra No	Proje Adı	Başlama ve Bitiş Tarihi	Proje Tutarı (TL)	Yapılan Harcama (TL)	Dön. Fiz. Gerç. (%)	Açıklama
1	Terminal Binası ve Müteammim Tesisler İle Apron Yapılması	2016-2018	46.945.551	2.952.895	30	Devam ediyor
2	Teknik Blok ve Kule Yapımı	2015-2016	10.207.000	4.712.364	80	Devam ediyor
3	Çevre Tel Örgü, Çevre Güvenlik Yolu ve Aydınlatılma İşi Yapımı	2016-2017	1.283.840	799.908	75	Devam ediyor
TOPLAM			58.436.391	8.465.167	62	

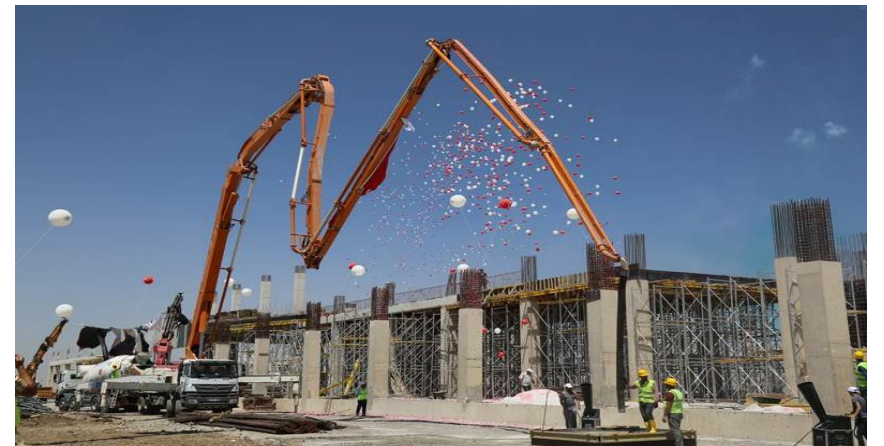

MUŞ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Sıra No	Proje Adı	Başlama ve Bitiş Tarihi	Proje Tutarı (TL)	Yapılan Harcama (TL)	Dön. Fiz. Gerç. (%)	Açıklama
1	Murat Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi	2017-2017	7.930.000	500.000	7	Devam ediyor
2	Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Projeleri	2017-2017	1.429.000	500.000	34	Devam ediyor
3	Ormanların Rehabilitasyonu	2017-2017	2.420.000	-	-	Devam ediyor
4	Orman Yangınları İle Mücadele Projesi	2017-2017	25.000	-	-	Devam ediyor
5	Orman Yolları	2017-2017	241.200	-	-	Devam ediyor
6	Tesisat, Tamirat ve Bahçe Bakım Giderleri	2017-2017	72.000	11.397	15	Devam ediyor
7	ORKÖY (Güneş Enerjisi ve Sığır Dağıtımı)	2016-2017	2.826.461	216.000	72	Devam ediyor
TOPLAM			14.943.661	1.227.397	18	



KREDİ YURTLAR KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ

Sıra No	Proje Adı	Başlama ve Bitiş Tarihi	Proje Tutarı (TL)	Yapılan Harcama (TL)	Dön. Fiz. Gerç. (%)	Açıklama
1	750 Kişilik Öğrenci Yurdu	2017-2018	30.000.000	-	-	İhale aşaması
TOPLAM			30.000.000	-	-	
